Verbouwing Zeilvereniging 2018/2019
Rev 1

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen	Hoeveelheid vrijwilligers	Inschrijflijst	coördinator activiteit
1									
2									
3	**1 Nieuwbouw loods Zeilvereniging**	**114 dagen**	**vri 27-7-18**	**zat 17-11-18**					
4	1.1 Lantaarnpaal verwijderen/kabel afkoppelen	1 dag	vri 27-7-18	vri 27-7-18		vrijwilligers	0 vrijwilligers	Rob	Wilfred
5	1.2 Uitzetten piketten	1 dag	vri 27-7-18	vri 27-7-18		vrijwilligers	0 vrijwilligers	Theo	Rob
6	1.3 Omzetten tegels op meer pallets	1 dag	vri 27-7-18	vri 27-7-18		vrijwilligers	minimaal 4 vrijwilligers		Rob
7	1.4 Uitgraven bouwput	1 dag	zat 28-7-18	zat 28-7-18	5	uitbesteed	0 vrijwilligers	Meijer	Rob
8	1.5 Afvoer zwarte grond	1 dag	zat 28-7-18	zat 28-7-18	5	uitbesteed	0 vrijwilligers	Meijer	Rob
9	1.6 Aanvoer zand	1 dag	zat 28-7-18	zat 28-7-18	5	uitbesteed	0 vrijwilligers	Meijer	Rob
10	1.7 Doek plaatsen	1 dag	zat 28-7-18	zat 28-7-18	5	vrijwilligers	1 vrijwilliger	Jurjen	Rob
11	1.8 Zand verdichten	1 dag	zat 28-7-18	zat 28-7-18	5	vrijwilligers	1 vrijwilliger	Jurjen	Rob
12									
13	1.9 Heipalen uitzetten	1 dag	zon 19-8-18	zon 19-8-18	11	vrijwilligers	2 Vrijwilligers	Theo	Rob
14	1.10 Heipalen slaan incl. beton	1 dag	maa 27-8-18	maa 27-8-18	13	uitbesteed	0 vrijwilligers		
15	1.11 Uitgraven rond palen, hoogte aangeven	1 dag	maa 27-8-18	maa 27-8-18		vrijwilligers	1 vrijwilliger	Klaas	Rob
16	1.12 Bovenzijde palen afslijpen	1 dag	maa 27-8-18	maa 27-8-18		uitbesteed	0 vrijwilligers		
17									
18	1.13 Graven fundatie	1 dag	vri 31-8-18	vri 31-8-18	14	vrijwilligers	minimaal 4 vrijwilligers		Rob
19	1.14 Bekisting plaatsen	1 dag	zat 1-9-18	zat 1-9-18	18	vrijwilligers	2 Vrijwilligers		Rob
20	1.15 Bewapening aanbrengen	1 dag	zat 1-9-18	zat 1-9-18	18	vrijwilligers	minimaal 2 vrijwilligers		Theo
21	1.16 Fundering storten	1 dag	maa 3-9-18	maa 3-9-18	20	uitbesteed	0 vrijwilligers		Rob
22	1.17 Droogtijd beton	25 dagen	din 4-9-18	vri 28-9-18	21	uitbesteed	0 vrijwilligers		
23									
24	1.18 Lijmankers uitmeten en plaatsen	1 dag	zat 29-9-18	zat 29-9-18	22	vrijwilligers	1 vrijwilliger		Rob
25	1.19 Plaatsen Staalconstructie	8 dagen	zat 29-9-18	zat 6-10-18	22	vrijwilligers	minimaal 4 vrijwilligers		Rob
28	1.20 Plaatsen borstwering	1 dag	zat 13-10-18	zat 13-10-18	25	vrijwilligers	minimaal 4 vrijwilligers		Wilfred
29	1.21 Plaatsen gevelplaten	15 dagen	zat 13-10-18	zat 27-10-18	25	vrijwilligers	minimaal 4 vrijwilligers		Wilfred
33	1.22 Plaatsen isolatie en dakbedekking	5 dagen	maa 29-10-18	vri 2-11-18	29	uitbesteed			
34	1.23 Zetwerk inmeten en aanleveren	5 dagen	maa 29-10-18	vri 2-11-18	29	uitbesteed			
35	1.24 Zetwerk aanbrengen	1 dag	zat 3-11-18	zat 3-11-18	34	vrijwilligers	2 Vrijwilligers		Rob
36	1.25 Plaatsen kozijnen/deuren/ramen	1 dag	zat 3-11-18	zat 3-11-18	29	vrijwilligers	2 Vrijwilligers		Rob
37	1.26 Plaatsen overheaddeuren	5 dagen	maa 29-10-18	vri 2-11-18	25	uitbesteed			
38									
39	1.27 Riolering aanleggen	1 dag	zat 3-11-18	zat 3-11-18	21	vrijwilligers	minimaal 4 vrijwilligers		Rob
40	1.28 Mantelbuis(zen) t.b.v. kabels aanbrengen	1 dag	zat 3-11-18	zat 3-11-18	21	vrijwilligers	2 Vrijwilligers		Rob
41									
42	1.29 Bestrating in de loods aanleggen	15 dagen	zat 20-10-18	zat 3-11-18	25	vrijwilligers	minimaal 4 vrijwilligers		Arjen
46	1.30 Elektrische installatie aanleggen	8 dagen	zat 27-10-18	zat 3-11-18	33	vrijwilligers	2 Vrijwilligers		Wilfred
49	1.31 Buitenbestrating aanleggen	15 dagen	zat 3-11-18	zat 17-11-18	42	vrijwilligers	minimaal 4 vrijwilligers		Arjen
53	**2 Verbouwing kleedruimtes inclusief ombouw watersysteem**	**92 dagen**	**zat 5-1-19**	**zat 6-4-19**					
54	2.1 schatting start tot eind	92 dagen	zat 5-1-19	zat 6-4-19		vrijwilligers			Wilfred/Theo

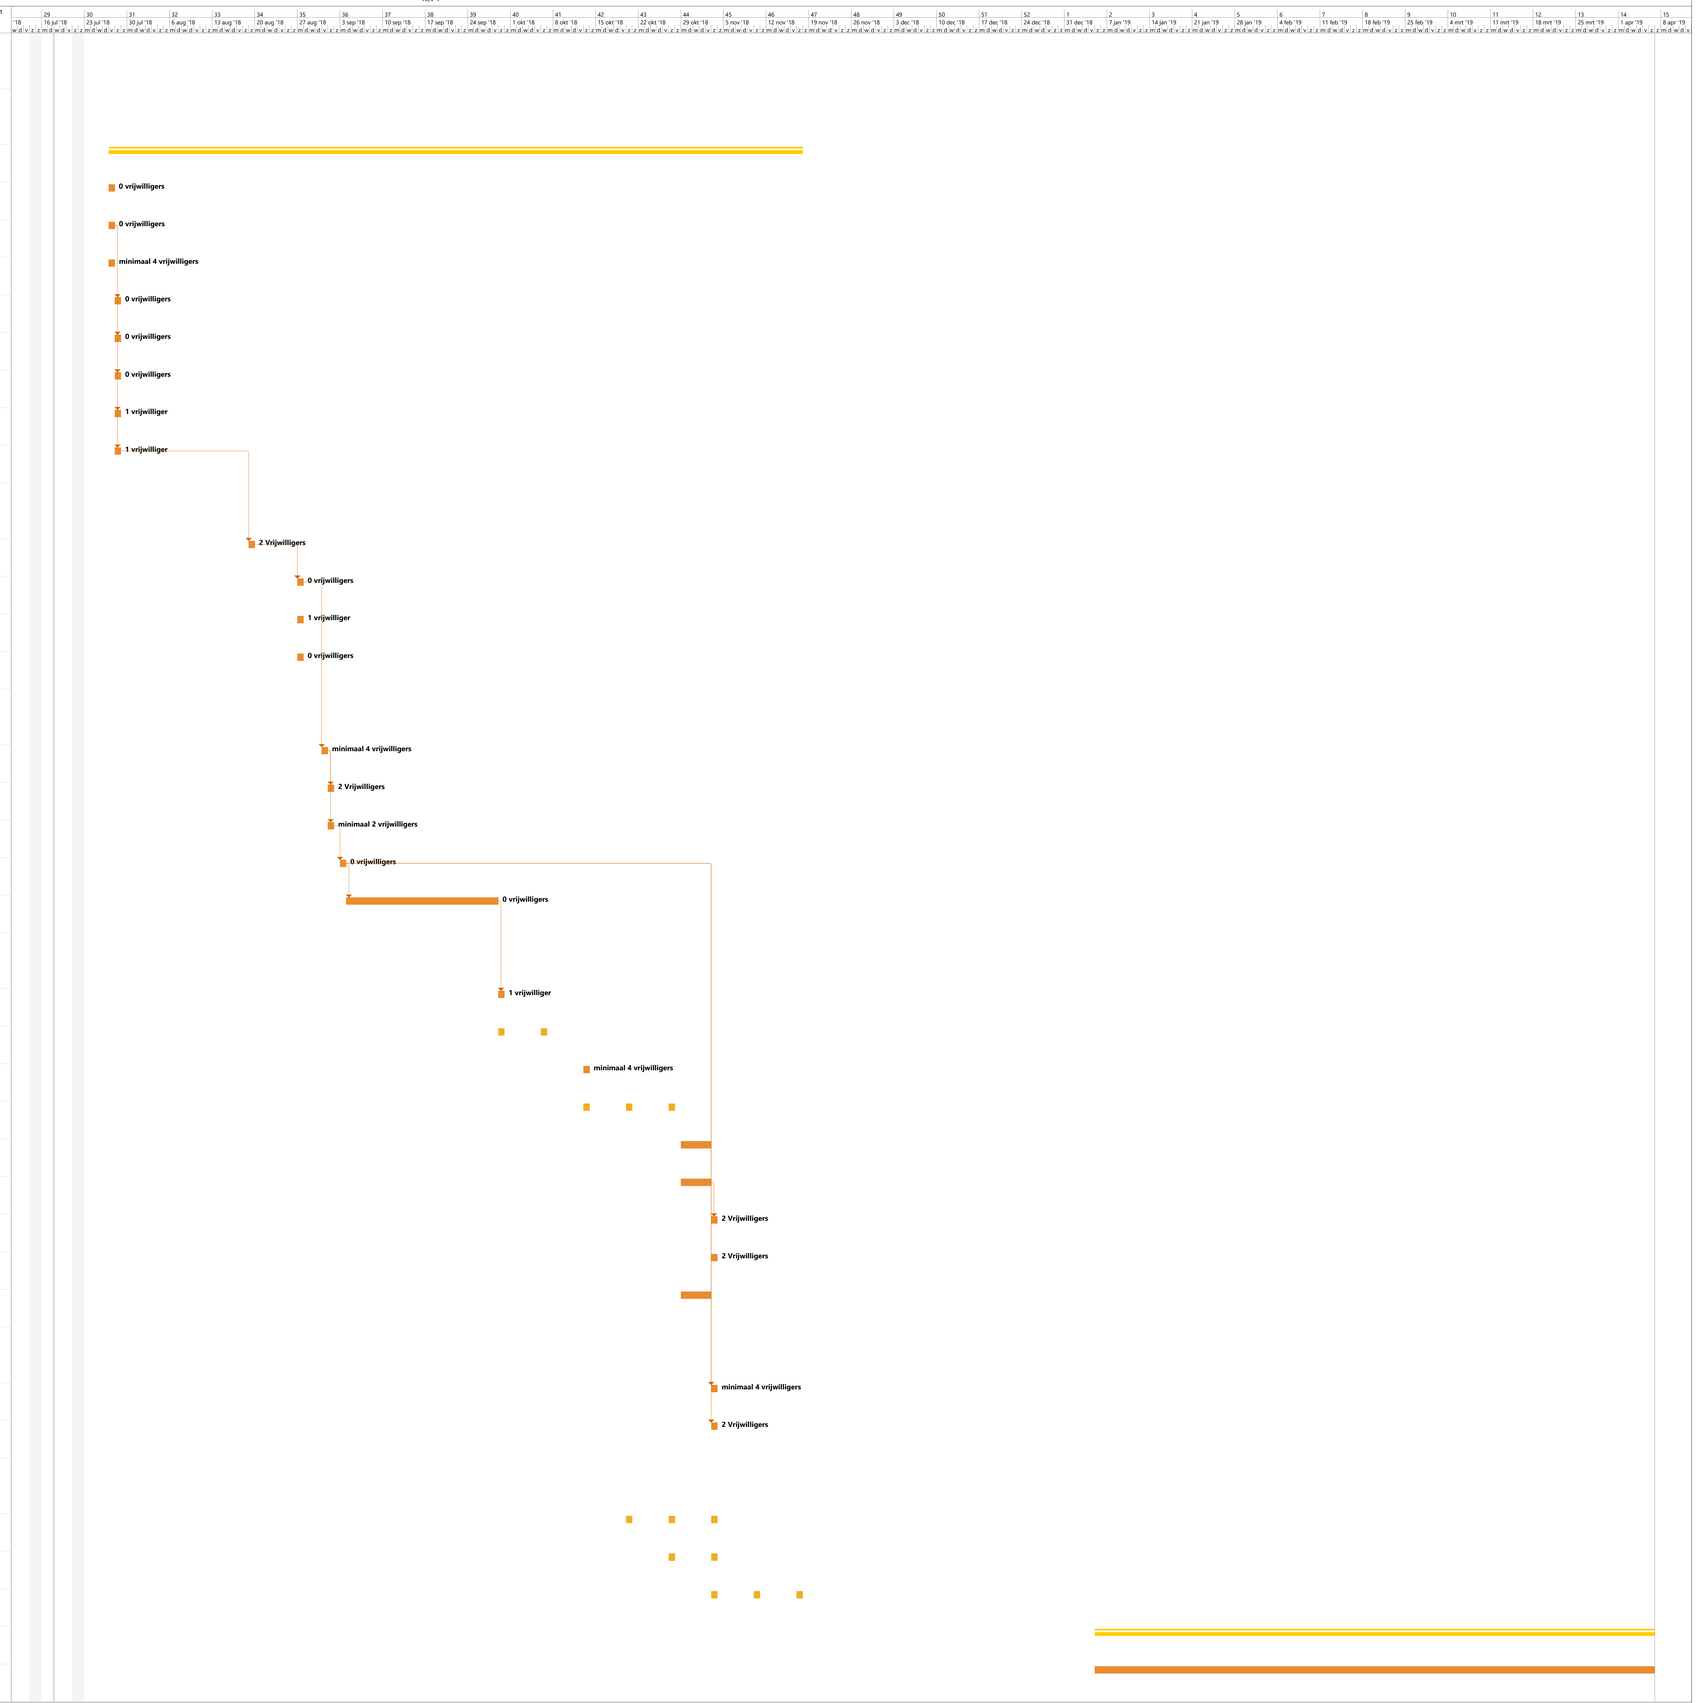

Project: Zeilvereniging loods
Datum: woe 18-7-18

Taak · Splitsing · Mijlpaal · Samenvatting · Projectsamenvatting · Inactieve taken · Inactieve mijlpaal · Inactieve samenvatting · Handmatig taak · Alleen duur · Handmatige samenvatting · Handmatige samenvatting · Alleen begindatum · Alleen einddatum · Externe taken · Externe mijlpaal · Deadline · Voortgang · Voortgang, handmatig
